


Konceptskabelon - eksempel

Sidste opdateringsdato : 01-05-2000

Risk-ansvarlig : Hans Pilfinger

Denne uges risikoprofil


Konsekvens

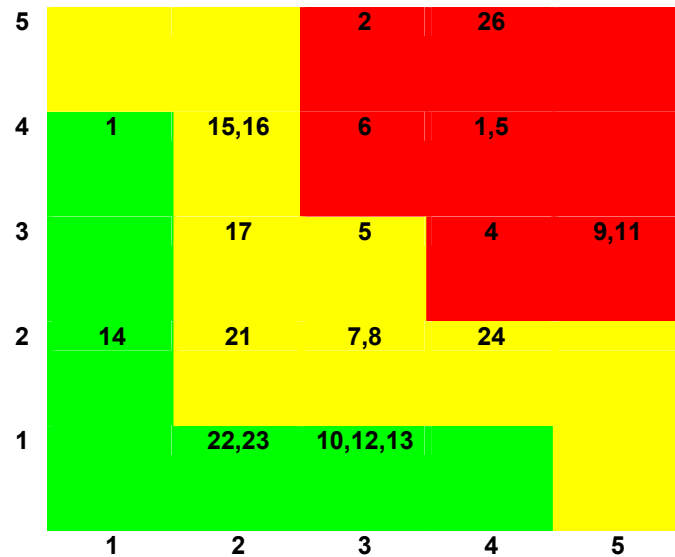

Sandsynlighed

Sidste uges risikoprofil

Konsekvens

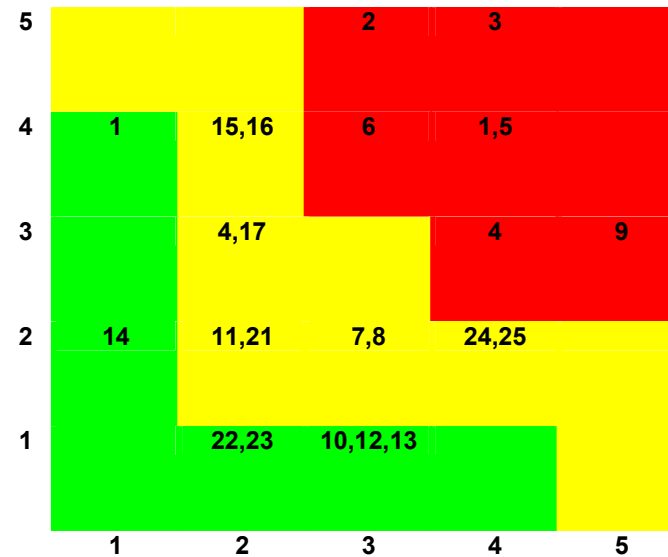

Sandsynlighed

Risk-ID	Risiko	Kons. i mdr. forsinkelse	Handlinger siden sidst	Deadline og ansvarlig	Anstal uger på listen	Kommentar
026	Styregruppeformand/ hovedsponsor fratræder 1-06-2000	2	Ekstraordinært styregruppemøde aftalt – ny styregruppeformand skal vælges. Forretningens beslutningskompetence skal fastlægges. Hans sikrer møde med styregruppeformand og fremtidig styregruppeformand inden 1-06-2000.	01.06.00 Hans	1	
01	Mangelfuld kravspecifikation	5	Prototyping og leveranceopdelt udvikling. Det er nødvendigt at forklare/få accept for udviklingsmodellen af administrationschef og marketingschef. Aftalt møde den 5-5-2000 mellem cheferne og Hans.	05.05.00 Hans	6	
009	Design opfylder ikke krav til svartider	1	Tidlig pilotopstilling og forsøg baseret på transaktionsgenerator. Pilotdesign forventes aftalt 15-05-2000, Jens Vatnise følger op.	15.05.00 Jens	3	
006	Mangelfuld brugerinvolvering	2	Kvalificerede slutbrugere kan ikke allokeres i tilstrækkeligt omfang grundet travlhed i forretningsområdet. Skal allokeres senest 15-05-2000, ellers vil projektet ikke kunne færdiggøre prototyper rettidigt. Konsekvenser kan først præciseres når antal, kvalifikationer, allokeringegrad og tidspunkt er aftalt. Hans har aftalt møde med Per Tågesnak den 10-05-2000.	15.05.00 Hans	4	
011	Mangelfuld underleverance fra Fup-Og –Svindel (FOS)	4	Interfacemodul ikke som forventet en hyldevare – skal specialudvikles. Nærmere betingelser og frister skal aftales. Hans har aftalt møde med FOS Account Manager Jesper Tusindfryd den 11-05-2000.	11.05.00 Hans	1	
002	Ingen erfaring med	5	Uddannelse og afprøvning på pilotopgave inden	15.06.00	6	

	udviklingsværktøj		anvendelse i projekt. Uddannelse gennemført. Pilotprojekt ikke gennemført – valgt fra. Leverandørkonsulent allokeres til projektet. Erfaringsrapport senest 15-06-2000.	Hans		
005	Implementeringsproblemer i Kina grundet kulturforskelle	3	Implementeringsforhold i Kina skal afklares. Aftalt besøg på repræsentative lokationer den 25-06-2000. Rapportering vedr. implementeringsforhold til Hans senest 07-07-2000.	07.07.00 Impl. lb	6	
004	Ingen erfaring med at drifte løsningen	3	Uddannelse af driftspersonale skal fastlægges og gennemføres inden afvikling af driftsprøve. Kontakt til leverandør af uddannelse taget – møde aftalt den 5-6-2000 mellem Hans, leverandør og driftsansvarlig.	05.06.00 Hans	6	
003	Finansiering af projektet ikke fastlagt	2	Finansiering aftalt – markedsafdeling bidrager med de resterende 6 mill. kroner.	01.05.00 styregruppen	5	
